


Comité de pilotage du programme ASA

\\Projet PROFAPAN

PROfessionnalisation des Filières Agricoles
Périurbaines d'Antananarivo Nord



Programme financé par l'Union Européenne



13 et 14 décembre 2018
COPILO 7





Comité de pilotage du programme ASA

\\Projet PROFAPAN

PROfessionnalisation des Filières Agricoles
Périurbaines d'Antananarivo Nord

\\ Sommaire :

1. Prévisions/ Réalisations (janvier 2015- décembre 2018)
2. Perspectives jusqu'à la fin du projet et stratégie
3. Capitalisation
4. Stratégie de durabilité du projet

Résultat 1 : Les productions des exploitations sont améliorées
Act.1 : Amélioration en quantité, qualité, régularité et diversité

	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTE
Identification des producteurs	Identification et formation de 5 000 producteurs	5 000 producteurs formés dont 4 500 enregistrés dans la BDD	Enregistrement de 5 producteurs dans la BDD
Identification et formation des MEX	Identification et formation de 500 Maîtres Exploitants	460 Maîtres Exploitants formés	Suivi encadrement quelques MEX non a formation sur traitement phytosanitaire
Appuis aux producteurs	Distribution des kits d'application des formations (semences, matériels, vaccins poulet)	Distribution des kits Suivi technico économique (Analyse des données)	Distribution des kits Suivi technico économique (Diffusion des résultats)



Légumes et verger



Compostière d'un MEX


Ré sultat 1 : Les produc tions des explo ita tions sont amé lioré es
Act.1 : Amé liora tion en quan tité , qua lité , ré gula rité et dive rsité

LES RETARDS

	Objectif	Réalisations	Observations
Activités d'élevage de poulet fermier	171 000 poulets vendus	76 711	Manque d'apport alimentaire



Lot de poussins

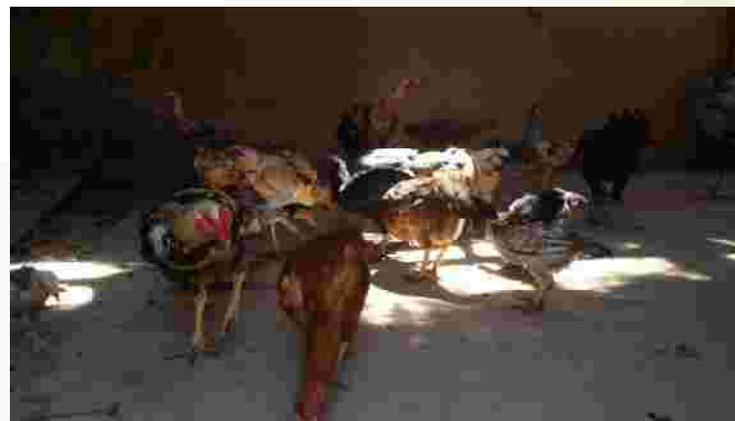

Bande de reproducteurs

Résultat 2 : Amélioration des Conditions de commercialisation et de l'accès au Marché
Act.2 : Dynamisation des filières et amélioration de l'accès au Marché

	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTE
Accès aux TPE Collecteurs	72 TPE commerciales identifiées et formées	88 TPE formées dont 4 TPE spécialisées pour les ventes en ville	2 formations (conditionnement formalisation)
Compartmentement des communes	Mise en œuvre de 3 projets communaux	Diagnostic des 33 Communes et mise en œuvre de 3 projets communaux dont 2 achevés	Finalisation du 3 ^{ème} projet à Andranonahoatra
Communications interprofessionnelles	6 ateliers interprofessionnels : 2 par an à partir de la 2 ^{ème} année du projet (saison sèche et saison pluviale)	5 ateliers interprofessionnels + 5 mémento de conseil de production et de commercialisation	1 atelier en saison sèche 2019



Mémento de conseil agricole



Nouveau hangar à Sabotsy



Nouveaux étalages à Sabotsy

Résultat 2 : Amélioration des Conditions de commercialisation et de l'accès au Marché
Act.2 : Dynamisation des filières et amélioration de l'accès au Marché

DIFFICULTES

	Objectif	Réalisation	Observations
Reconstitution de fonds	88	40	TPE non actives ou en difficultés de gestion de fonds
Enregistrement dans le cahier journal	88	40	Sorties d'argent pour utilisation extra omises



Manifestation économique des TPE

Résultat 3 : Capacités techniques et organisationnelles des OP renforcées
Act.3 : Renforcement des capacités de services en lien avec les autres dispositifs existants

Mise en place
de la promotion
du SPG

Promotion
de la fabrication
de dispositifs

Renforcement
des capacités
des dispositifs

PREVISIONS	REALISATIONS	RESTE
2 ateliers SPG annuels par territoire 4 ateliers semestriels par dispositifs par an (2017-2019)	1 atelier SPG par territoire + 1 atelier de brainstorming + 1 atelier semestriel par dispositif	1 atelier annuel 2 ateliers semestriels par dispositif
Mise en place de 72 dispositifs - Elaboration et mise en œuvre de 4 plans d'action semestriels par dispositif	Mise en place de 84 dispositifs - Elaboration et mise en œuvre d'1 plan d'action semestriel par dispositif + fonds revolving (kits dispositifs)	Elaboration et mise en œuvre de 2 plans d'action semestriels par dispositif + fonds revolving
Formations Diffusion SIM	Formations par les MEX Diffusion mensuelle SMS SIM Mise en place de tableau hebdomadaire sur 3 Communes	Formations par les MEX Mise en place de tableau hebdomadaire par dispositif

Résultat 3 : Capacités techniques et organisationnelles des OP renforcées
Act.3 : Renforcement des capacités de services en lien avec les autres dispositifs existants

DIFFICULTES

	Objectif	Réalisation	Observations
Mise en œuvre de fonds revolving (kits dispositifs)	84 fonds	84 fonds	Reconstitution difficile des fonds (cotisation ne couvre pas les coûts d'amortissement des matériels)



Broyeur à compost à Talatavolonondry



Motopompe à Iarinarivo



Petits matériels agricoles pour dispositif

Activités transversales

Partenariat

Mise en œuvre de la convention avec CEAS : recherche développement sur matériels pour TPE et producteurs : charrette de marché, vélo modifié, présentoir de produits agro-écologiques, système d'irrigation (avec motopompe), broyeur à compost



Prototype 0 de broyeur à compost



Prototype 1 charrette de marché

PROSPECTIVES JUSQU'À LA FIN DU PROJET ET STRATEGIE

Prospectives

	Objectif	Prévision (prolongation)	Stratégie
Développer les activités d'élevage de poulet fermier	171 000 poulets vendus	157 000	Renforcer les compétences techniques des MEx aviculteurs Appuyer les éleveurs potentiels (IMF,...)
Consolider la relation TPE - producteurs	72 TPE collaborent avec les dispositifs	Appuyer les 30 TPE en difficultés sur la gestion des fonds	Conseil et accompagnement individuel des TPE
Appuyer les dispositifs à rendre des services de qualité	72 dispositifs rendent des services utiles aux membres (production et commercialisation)	Formation et appuis directs aux 72 dispositifs	Accompagner les dispositifs dans la gestion des activités



Elevage de poulets



TPE en action



Appuis au dispositif

Réalisations

Préparation
/identification des
thèmes

- Initialisation à la capitalisation
- Création de 3 groupes de travail
- Mise en place du dispositif de pilotage
- 3 grands thèmes : STE, TPE, Dispositif /groupe d'acteurs (mise en place et mise en œuvre/appuis),...

Elaboration plan
d'action/ structuration
des savoirs

- Planning des activités
- Préparation des blocs d'informations

Recueil/ formulation/
validation (1ère partie
avec TA)

- Mise au point des méthodes et des outils de collecte de données



Maquette
document
capitalisation

STRATÉGIE DE DURABILITÉ DU PROJET

Renforcement du réseau MEx

- Formation sur la gestion des activités de service
- Diversification des services fournis par les MEx
- Accompagnement pour la formalisation et référencement officiel (FDA, CSA)

Assurer l'autonomisation des TPE commerciales

- Suivi et analyse des résultats économiques des TP
- Suivi de la réalisation du business plan et conseil par rapport au plan de développement

Renforcement des capacités des dispositifs à fournir des services aux membres et à assurer l'approvisionnement de produits de qualité

- Renforcer les capacités des dispositifs à gérer des activités (fonds revolving, business plan)
- Concentrer le volume de production
- Mettre en œuvre le SPG (structurer les demandes, contrôle de qualité, régulariser la production)



Pépinière de Mex à Ambatomena



Nouveau point de vente à Ivandry

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION



Programme financé par l'Union Européenne



Pour un développement équitable

